P R Y A M O P R O J E C T D O C U M E N T S

Документы проекта ПРЯМО

Роадмап · бюджет · команда

Роадмап: четыре фазы, детализация до кварталов

Бюджет: сценарии bootstrap и посев

Команда: план найма по фазам

Версия 1.0 · октябрь 2026

Содержание

1. Резюме **1**

2. Роадмап **2**

2.1. Фазы и кварталы 2

2.2. Переход «фаза 1 → фаза 2»: правила включения монетизации 2

2.3. Риски роадмапа 3

3. Бюджет **3**

3.1. Сценарий A: bootstrap (один город, шесть месяцев) 3

3.2. Сценарий B: посев (команда и 2–7 городов) 4

3.3. Стоимость запуска одного города 5

4. Команда **6**

4.1. Сейчас 6

4.2. План найма по фазам 6

5. Открытые вопросы основателю **6**

Примечание: содержание построено на кодах полей. После редактирования документа обновите номера страниц: щёлкните по содержанию правой кнопкой мыши и выберите «Обновить поле».

1. Резюме

Пакет из трёх документов: роадмап с детализацией до кварталов, бюджет в двух сценариях (bootstrap и посев) и план команды по фазам. Все три отвечают на один вопрос операционного директора: сколько стоит войти в город-миллионник до точки ликвидности и что для этого нужно.

Ключевая асимметрия: bootstrap-запуск города обходится примерно в 0,5–0,9 млн ₽ деньгами плюс время основателя (допущение), тогда как каждый процент рынка России — это около 1,8 млрд ₽ выручки в год (внутренняя оценка). Диспропорция затрат и призового фонда — центральный аргумент посевного раунда.

Трекшн на момент пакета: лендинг из 23 секций, живое демо диспетчеризации на WebSocket-движке, рабочие MVP-приложения пассажира и водителя (сквозной цикл до чека, рейтинга и чаевых подтверждён end-to-end), лист ожидания. Продукт построен соло-основателем.

2. Роадмап

2.1. Фазы и кварталы

Четыре фазы стратегии, детализированные до кварталов. Каждая веха имеет критерий готовности (DoD) — объективное условие перехода, а не календарную дату: если ликвидность не достигнута, фаза не закрывается.

Таблица 1. Роадмап до кварталов

Квартал	Веха	Критерий готовности (DoD)	Ключевые метрики фазы
Q1 (мес 1–3)	Город выбран; бета 50 водителей	Воронка психотеста работает; передача в ФГИС «в момент события» протестирована; подписаны 2 корпоративных якоря	Выполнение ≥ 70%; NPS водителя ≥ 40
Q2 (мес 4–6)	Ликвидность стартовых зон; «первая волна» 1 000 водителей (0% на 3 месяца)	2 недели подряд: ETA ≤ 7 минут, выполнение ≥ 80%	1 000+ заказов/день; CAC водителя ≤ 5 400 ₽

Квартал	Веха	Критерий готовности (DoD)	Ключевые метрики фазы
Q3 (мес 7–9)	Включение монетизации в первой волне (когортно, по мере окончания 0%)	Лента стабильна без бесплатных когорт; оффер Pro показан в приложении	Конверсия волны в 12%/Pro ≥ 60% (цель); удержание водителя 90 дней ≥ 60% (цель)
Q4 (мес 10–12)	Города 2–3 по плейбуку «домино»	Плейбук запуска города документирован; стоимость запуска измерена	Запуск города 2 дешевле города 1 на ≥ 30% (цель)
Q5–Q6 (мес 13–18)	5–7 городов; корпсчета; топливная карта	ETA < 7 минут в зонах покрытия всех городов	5%+ рынка в городах присутствия (цель)
Годы 2–3	Экосистема: ТО, лизинг, страховка, межгород, грузовые, открытый API	Партнёрские договоры; API публичен	10%+ рынка
Год 3+	Топ-30 городов; отраслевой стандарт прозрачной комиссии	—	Смерть модели «40% с водителя» как класса

2.2. Переход «фаза 1 → фаза 2»: правила включения монетизации

Момент, когда у первой тысячи заканчивается 0% — самый чувствительный в проекте. Три правила снимают риск оттока:

1. Когортность: монетизация включается по мере окончания льготы у каждой сотни волны, а не единой датой — пик недовольства размазывается и обрабатывается персонально.
2. Порядок: только после ликвидности — водитель уже видит полную ленту, и комиссия 12% всё равно оставляет его в плюсе на +123% к монополии.
3. Прозрачность выбора: водителю показывается его личный расчёт «0% против 12% против Pro» на его же обороте; точка безразличия Pro — около 21 000 ₽ выручки в месяц.

2.3. Риски роадмапа

Таблица 2. Риски роадмапа

Риск	Вероятность	Влияние	Контр-ход
Ответ монополии бонусами в городах запуска	высокая	среднее	Контент «бонус кончается — 12% остаются»; фокус аргументации на ₽/час, а не на разовом бонусе
Не набрать 1 000 водителей к концу Q2	средняя	высокое	Рефералка 5% на 6 месяцев, лига таксопарков, статус «первой волны» как мотив
Регуляторные изменения в правилах ФГИС	низкая	среднее	Юрист по 69-ФЗ на подряде с Q1, резерв бюджета на адаптацию
Выгорание основателя (один человек в поле)	высокая	критическое	Переход к посевному сценарию сразу после ликвидности города 1; найм city-launcher в первую очередь

3. Бюджет

3.1. Сценарий A: bootstrap (один город, шесть месяцев)

Минимальный сценарий — всё силами основателя. Основная валюта — его часы и его собственный отчёт смены как маркетинговое оружие.

Таблица 3. Бюджет bootstrap-запуска города (допущения)

Статья	Сумма, ₽
Юрструктура: ООО, счёт, разрешения, оферта	40 000–80 000
Инфраструктура: серверы, мониторинг, пуши и SMS (6 месяцев)	120 000–240 000
ФГИС-интеграция: труд основателя + аудит подрядчиком	50 000
Эквайринг, СБП, медосмотры	переменные — уже учтены в unit-экономике поездки
Полевой маркетинг: стоянки, событие запуска, печать, ГСМ	120 000–240 000
Резерв 20%	80 000–120 000
Итого деньгами	≈ 0,5–0,9 млн + время основателя

Data insight: bootstrap-запуск города стоит меньше одной телевизионной кампании монополиста. Это не метафора, а рамка переговоров с инвесторами: асимметрия затрат — наш структурный резерв времени.

3.2. Сценарий B: посев (команда и 2–7 городов)

Ставки указаны как допущения рынка РФ на 2026 год; итоговые цифры подтверждается наймом. ФОТ на крейсере — около 1,2–1,7 млн ₽ в месяц с налогами.

Таблица 4. Команда сценария B (ставки — допущения)

Роль	Ставка, ₽/мес	Месяц ввода
Основатель-CEO	150 000–200 000	0
Backend / платформа	200 000–250 000	1
Mobile (cross-platform), 2 чел.	180 000–250 000 каждый	3 и 6
City-launcher / операции	120 000–180 000	4
Поддержка, 2 чел.	60 000–90 000 каждый	6 и 9
Юрист 69-ФЗ (подряд)	80 000–150 000	1

Полевой запуск каждого следующего города — 300–600 тыс. ₽ (допущение), дешевеет с каждым плейбуком. Три варианта раунда различаются не ставками, а количеством городов и горизонтами:

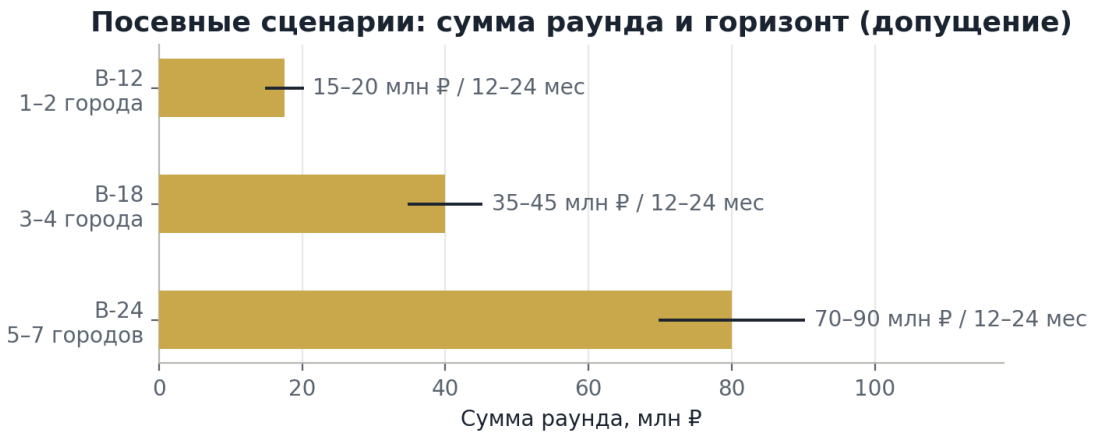


Рисунок 1. Посевные сценарии: суммы и горизонты (все значения — допущения для валидации)

Таблица 5. Варианты посевного раунда (допущения)

Вариант	Сумма, млн ₽	Runway	Что покупает
B-12	15–20	12 мес	Команда + 1–2 города до ликвидности

Вариант	Сумма, млн ₽	Runway	Что покупает
B-18	35–45	18 мес	3–4 города, устойчивая монетизация
B-24	70–90	24 мес	5–7 городов + задел экосистемы (ТО, лизинг)

3.3. Стоимость запуска одного города

Число для питча: вход в город-миллионник до точки ликвидности стоит ≈ 0,5–0,9 млн ₽ в bootstrap и ≈ 6–10 млн ₽ с командой (доля ФОТ и полевые расходы; допущение). При этом каждый 1% рынка — около 1,8 млрд ₽ выручки в год. Даже консервативные 3–5% рынка в городах присутствия к месяцу 18 делают асимметрию очевидной.

Unit-экономика для сверки: чек 825 ₽ → комиссия 12% = 99 ₽ → минус эквайринг 12 ₽, ФГИС и инфраструктура 20 ₽, поддержка 13 ₽ → маржа ≈ 54 ₽ с поездки. Подписка Pro 2 490 ₽/мес окупается водителю от ~21 000 ₽ выручки в месяц. Все значения соответствуют калькулятору на лендинге (пример: оборот 194 400 ₽/мес → на PAYG остаётся 171 072 ₽, на Pro — 191 910 ₽).

4. Команда

4.1. Сейчас

Один основатель: архитектор и разработчик (лендинг, движок демо, MVP-приложения end-to-end), маркетолог поля и действующий водитель такси — автор реального отчёта смены (20 заказов, 16 502 ₽ выручки, 60,4% удержаний монополиста). Редкое сочетание: продукт строится изнутри боли, а не по кабинетным интервью.

4.2. План найма по фазам

Таблица 6. Роли, фазы и закрываемые метрики

Роль	Фаза	Зачем	Метрика, которую закрывает
Backend / платформа	Ф1	Движок заказов, ФГИС, выплаты	Uptime ядра; время «заказ → водитель»
Mobile ×2	Ф1–Ф2	Пять платформ: App Store, Google Play, RuStore, APK, PWA	DAU; доля сессий без падений
City-launcher	Ф2	Плейбук «домино», стоянки, корпоративные якоря	CAC; неделя ликвидности города

Роль	Фаза	Зачем	Метрика, которую закрывает
Диспетчер-операции	Ф1 (подряд) → Ф2 (штат)	Ночные контуры, разбор инцидентов	Доля отмен; ETA
Юрист 69-ФЗ / 176-ФЗ	подряд с Q1	Оферты, допуски, ФГИС	Ноль комплаенс-инцидентов
Поддержка ×2	Ф2	Апелляции, SLA 24 часа	NPS обеих сторон
Безопасность данных	Ф2 (подряд)	Персональные данные, телеметрия	Ноль утечек

Принцип «основатель должен кушать»: зарплата основателя — строка бюджета сценария B с первого месяца (150–200 тыс. ₽, допущение), дивиденды — с маржи (≈ 54 ₽ с поездки), а не со штрафов: штрафов в модели нет. Первым нанимается city-launcher: он разгружает единственный невоспроизводимый ресурс — время основателя.

5. Открытые вопросы основателю

Четыре решения, без которых бюджет не превращается в календарь: город и дата запуска; собственная сумма в сценарии A (рамка 0,5–0,9 млн ₽); целевой вариант раунда — B-12, B-18 или B-24; готовность делегировать city-launcher после первого города. Каждое из решений фиксируется отдельной записью и обновляет настоящий пакет.
